

СІТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ



«МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
БӨЛІМІ»

мемлекеттік мекемесі

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное учреждение
«ОТДЕЛ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
МАҚТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА»

165500, Жетісай қ.М.Әуезов көшесі к/з
Тел: (8-72534) 6-71-71, ММ коды 50547672
СТН 581000216204, БИН 081140013844
Шымкент қ.ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ

165500, г.Жетісай, ул. М.Ауезова б/н.
Тел: (8-72534) 6-71 -71, код ГУ 50547672.
РНН 5810002162043 ИК 081140013844
ГУ Департамент Казначейства по г.Шымкент

№
15.12.2012 № 22-3,5

**ЖШС «Орынқыз-ана» балабақша
ғимаратының иесі А.Қ.Маликовке**

Сңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал ауданы Атамекен ауыл округі, Қоғалы ауылында орналасқан «Орынқыз-ана» балабақшасы ЖШС-нің ғимаратына 2012 жыл 26 наурыз күні өрт техникалық тексеру жұмысын жүргізді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша Мақтарал ауданы Атамекен ауыл округі, Қоғалы ауылында орналасқан «Орынқыз-ана» балабақшасы ЖШС-нің өрт қауіпсіздігі талапқа сай екені анықталды.

**Мақтарал ауданының ТЖБ-і бастығы
өртке қарсы қызмет подполковнигі**

Б. Абдазимов

Б.Абдазимов.

тел: 6-71-71

АКТ приемки в эксплуатацию

Автоматической пожарной сигнализации

Город район Исительский "14" март 2012 г.

Комиссия, назначения ТОО Детский сад Орхон-ана

Решением от "14" март 2012 г. № в составе:
Председателя – представителя заказчика (генподрядчика) ТОО Детский сад Орхон-ана
Мамедов К.А.

Членов комиссии – представителей:
Монтажной организации И.П. Асабаев А.

Пусконаладочной организации И.П. Асабаев А.

Государственного пожарного контроля Оче района п/п п/с Б. Абдуллин

Произвела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно – наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке

Установка пожарная сигнализация, смонтированная в детский сад
Орхон-ана сельский округ Атамань с/с/к/о/а
по проекту, разработанному (составленному) ТОО "Астана Технопроект-НТ"

2. Монтажные работы выполнены И.П. Асабаев А.
с "14" март 2012 г. по "15" март 2012 г.

Сметная стоимость монтажных работ 72 000 тенге

Фактическая стоимость монтажных работ И.П. Асабаев А.

3. Пусконаладочные работы выполнены И.П. Асабаев А.
с "14" март 2012 г. по "15" март 2012 г.

При этом установлено следующее оборудование: кварц-3-1мб
извещатель дымовый И.П. 212-41-7мб
извещатель тепловой И.П. 103-1А
2 мб, извещатель пожарной ручная 1мб, оповещатель
Звукотрой и световой
пд-96-1мб

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки установлены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).
Заключение комиссии:

Установку прошедшую комплексное опробование включая и пусконаладочные работы,
считать принятой в эксплуатацию с " " 20__ года с оценкой качества
Выполненных работ на хорошо (отлично, хорошо, удовлетворительно).

Перечень прилагаемой к акту документации:

проект

Комиссия:

Председатель комиссии К. Мамедов (подпись)

М.П. Члены комиссии А. Асабаев (подпись)

Б. Абдуллин (подпись)

Общие указания

Рабочий проект разработан на основании:
- действующих норм и правил проектирования, государственных стандартов Республики Казахстан и в соответствии с СНиП 2.02-15-2003.
СН РК 2.02-11-2202, ГОСТ -21-603-80, ВСН60-89.

Пожарная сигнализация.

Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается автоматическая пожарная сигнализация. В качестве контрольно-приемного прибора принят "Кварц" и на 2 шлейф с автономным источником питания. Питание прибора ПС предусматривается от щита ЦАО кабелем КПСВВ 2х0,5мм. Прибор ПС устанавливается в сервере. В защищаемых помещениях на потолке устанавливаются дымовые датчики типа ИП212-41, ИП-101 и сирена ЛД-96. Абонентская разводка выполняется кабелем КРВППМ 2х2х0,4 открыто. Проектом предусматривается светозвуковое оповещение людей о пожаре.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Общие указания	
2	Схема расположения сетей пожарной сигнализации	
3	План расположения сетей пожарной сигнализации	
4	Спецификация пожарной сигнализации	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СН РК 2.02-11-2002	"Нормы оборудования зданий и помещений и, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре"	
СНиП 2.02-15-2003	Пожарная автоматизация зданий и сооружений	
	Перечень пожарной технической документации допущенной к применению на территории Республики Казахстан. Выпуск 6	
21.603-80	Связь и сигнализация	
ВСН60-89	Нормы проектирования устройств связи	
	Прилагаемые документы	
012-2008.ПС.С	Спецификация оборудования	1 листа

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия обеспечивающие взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации зданий


Директор  Акбаев А.



						19-03-2012			ПС			
						Заказчик: ТОО "Орынкыз-ана"						
Изм.	Кол.	Лист	док.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов	
									Р	1	4	
Разраб.	Ким В.					Общие данные			ТОО "Астана ЖолПроект - НТ"			

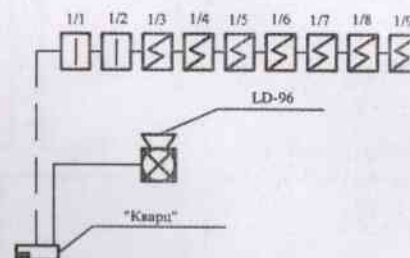

						19-03-2012	ПС
						Заказчик: ТОО "Орынжыз-ана"	
Изм.	Кол.	Лист	док.	Подпись	Дата		Стадия
							Р
							Лист
							Листов
Разраб.	Ким В.					Схема расположения сетей пожарной сигнализации	ТОО "Астана ЖолПроект - НТ"

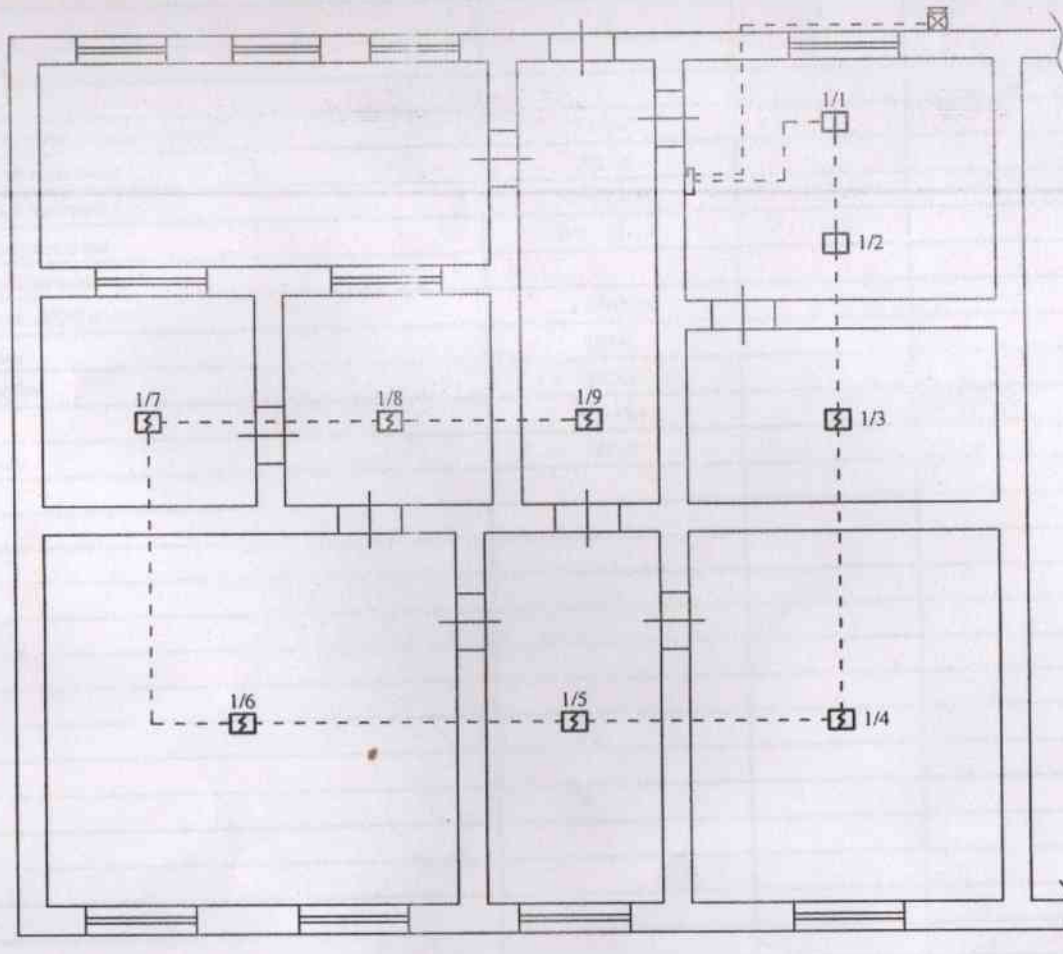

						19-03-2012	ПС		
						Заказчик: ТОО "Орындыз-ана"			
Изм.	Кол.	Лист	док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
							Р	3	
Разраб.	Ким В.					Схема расположения сетей пожарной сигнализации	ТОО "Астана ЖолПроект - НТ"		

